



Regione Siciliana

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana


II Servizio – Distretto Costa Jonica

Opere contenimento versante a protezione della S.P. 35 di Pezzolo.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA

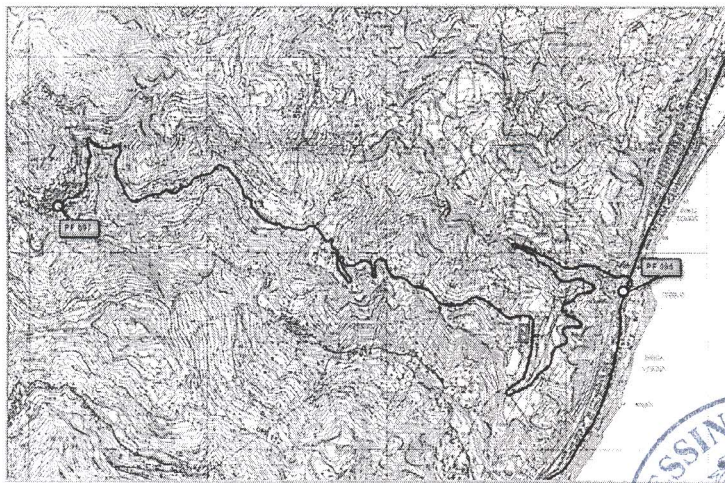

Visti ed approvazioni: Il R.U.P. visti gli elaborati progettuali, APPROVA in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011 e dell'art. 24 della l.r. 08/2016 e s.m.i.

PARERE n° 13 del 02 APR. 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

Progettisti:

Geom. Carmelo G. MAGGIOLATI

Geom. Pasquale CHIARA

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giovanni LENTINI

Data
01 APR. 2019

Il Dirigente F.F.:
Dr. Francesco ROCCAFORTE

Tav. 13

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA – 2° SERVIZIO DISTRETTO COSTA JONICA

OGGETTO: Opere contenimento versante a protezione della S.P. 35 di Pezzolo.
C.U.P.: B47H17001580002

C R O N O P R O G R A M M A

I lavori di cui all'oggetto dovranno essere condotti ed eseguiti dall'impresa aggiudicataria nell'arco di tempo scaturito dall'elaborazione sotto riportata, che tiene conto di tutti gli elementi (condizioni climatiche stagionali) che possono influire sulla normale esecuzione delle opere determinandone variazioni di produttività.

Pertanto l'impresa aggiudicataria dei lavori non può, per l'esecuzione delle opere previste in progetto, richiedere sospensioni e/o proroghe avendo preventivato nel presente programma lavori tutti i fattori climatici, sia essi positivi che negativi, riscontrabili durante l'arco di tempo previsto per la detta esecuzione.

A tal fine si stabilisce convenzionalmente:

I = Importo complessivo dei lavori:	€.	154.180,02
i = produzione ottimale mensile:	€.	75.000,00
Ig = produzione ottimale giornaliera (i/30):	€.	2.500,00
c = coefficiente per condizioni climatiche normali:		1,54
n = gg. tempo utile contrattuale (I/i * c * 30):		90
n° = tempo di avvio cantiere in giorni:		1
N = tempo teorico contrattuale in giorni (N= n+n°)		91

Produzioni differenziate per l'anno

1	Gennaio	0,75 i	€ 56.250,00	GG. 31
2	Febbraio	0,75 i	€ 56.250,00	GG. 28
3	Marzo	0,75 i	€ 56.250,00	GG. 31
4	Aprile	0,90 i	€ 67.500,00	GG. 30
5	Maggio	0,90 i	€ 67.500,00	GG. 31
6	Giugno	0,90 i	€ 67.500,00	GG. 30
7	Luglio	0,90 i	€ 67.500,00	GG. 31
8	Agosto	0,45 i	€ 33.750,00	GG. 31
9	Settembre	0,90 i	€ 67.500,00	GG. 30
10	Ottobre	0,90 i	€ 67.500,00	GG. 31
11	Novembre	0,75 i	€ 56.250,00	GG. 30
12	Dicembre	0,45 i	€ 33.750,00	GG. 31

Ipotesi di sviluppo

Si ipotizza una consegna lavori in data 01/10/2019:

- Consegna lavori in data 01/10/2019
- Inizio lavori in data 03/10/2019

DATA	GIORNI TRASCORSI		IMPORTO PARZIALE	IMPORTO PROGRESSIVO
avvio cantiere	2	2	€ 0,00	€ 0,00
Ottobre '19	29	31	€ 67.500,00	€ 67.500,00
Novembre '19	30	61	€ 56.250,00	€ 123.750,00
Dicembre '19	31	92	€ 33.750,00	€ 157.500,00
Gennaio '20	17	109	€ 56.250,00	€ 213.750,00

La durata dei lavori è quindi risultata pari a 90 giorni, con una differenza in meno di giorni 11 rispetto ai tempi previsti.

Lo sviluppo progressivo delle lavorazioni come sopra riportato, ha validità esclusivamente nel suo complesso, ciò al fine di stabilire il periodo utile per il completamento delle opere progettate.

L'eventuale mancato completamento dell'opera nei tempi assegnati, tranne per cause non preventivabili in fase progettuale, comporterà per l'impresa esecutrice dei lavori l'applicazione di una penale pari allo 0,1% giornaliero dell'importo contrattuale, e comunque non superiore al 10% così come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I PROGETTISTI
