



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

C.I.G. :

C.U.P. : B47H20009990001

**PROGETTO ESECUTIVO**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 56, 58, 61 bis, 61 quater e 76.

**ALLEGATI :**

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM;
- TAV. 2 Corografia scala 1:10.000;
- TAV. 3 Tavola interventi;
- TAV. 4 Particolari costruttivi;
- TAV. 5 Specifiche SS.PP. da stradario Città Metropolitana;

**ALLEGATO 10**

**CRONOPROGRAMMA**

Messina, lì 03/10/2022

**Progettisti :**

**Geom. Michele Quarto**

**Geom. Filadelfo Magno**

**Geom. Sergio Castorina**

Visto: IL R.U.P.

**Ing. Antonino SCIUTTERI**

Visti ed Approvazioni

<b>IMPORTO LAVORI</b>		€ 1.134.500,00
<b>i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE</b>		€ 164.000,00
<b>i<sub>g</sub> PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA</b>		€ 8.729,09
<b>C coeffic. Cond. Climatiche</b>	0,8	
<b>n tempo utile contrattuale</b>	$((l/i)*C*30)$	166
<b>n° tempo di avvio cantiere</b>		15
<b>N TEMPO CONTRATTUALE</b>		181

### PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	12	) =	€ 165.852,62
2 FEBBRAIO	i <sub>g</sub>	*(	28	-	12	) =	€ 139.665,36
3 MARZO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	10	) =	€ 183.310,79
4 APRILE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	) =	€ 192.039,87
5 MAGGIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	) =	€ 200.768,96
6 GIUGNO	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	) =	€ 192.039,87
7 LUGLIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	) =	€ 200.768,96
8 AGOSTO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	10	) =	€ 183.310,79
9 SETTEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	) =	€ 192.039,87
10 OTTOBRE	i <sub>g</sub>	*(	31	-	10	) =	€ 183.310,79
11 NOVEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	12	) =	€ 157.123,53
12 DICEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	31	-	12	) =	€ 165.852,62


### IPOTESI DI SVILUPPO


MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
MARZO	31	€ 183.310,79	€ 183.310,79
APRILE	30	€ 192.039,87	€ 375.350,66
MAGGIO	31	€ 200.768,96	€ 576.119,61
GIUGNO	15	€ 192.039,87	€ 768.159,48
LUGLIO	31	€ 200.768,96	€ 968.928,44
AGOSTO	28	€ 165.571,03	€ 1.134.499,47
<b>Avvio Cantiere</b>	<b>15</b>		
	<b>181</b>	<b>TEMPO CONTRATTUALE</b>	







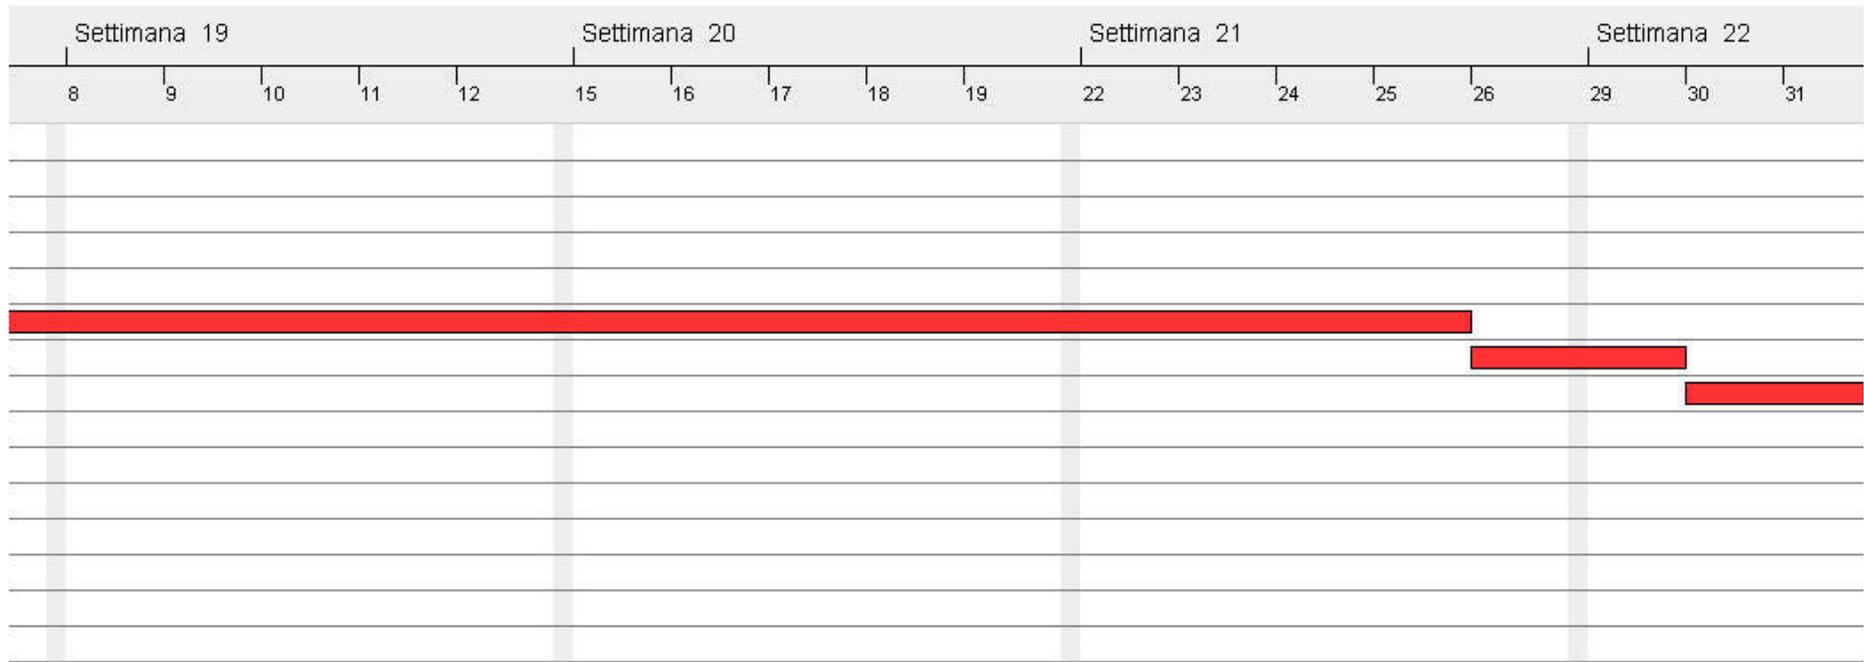

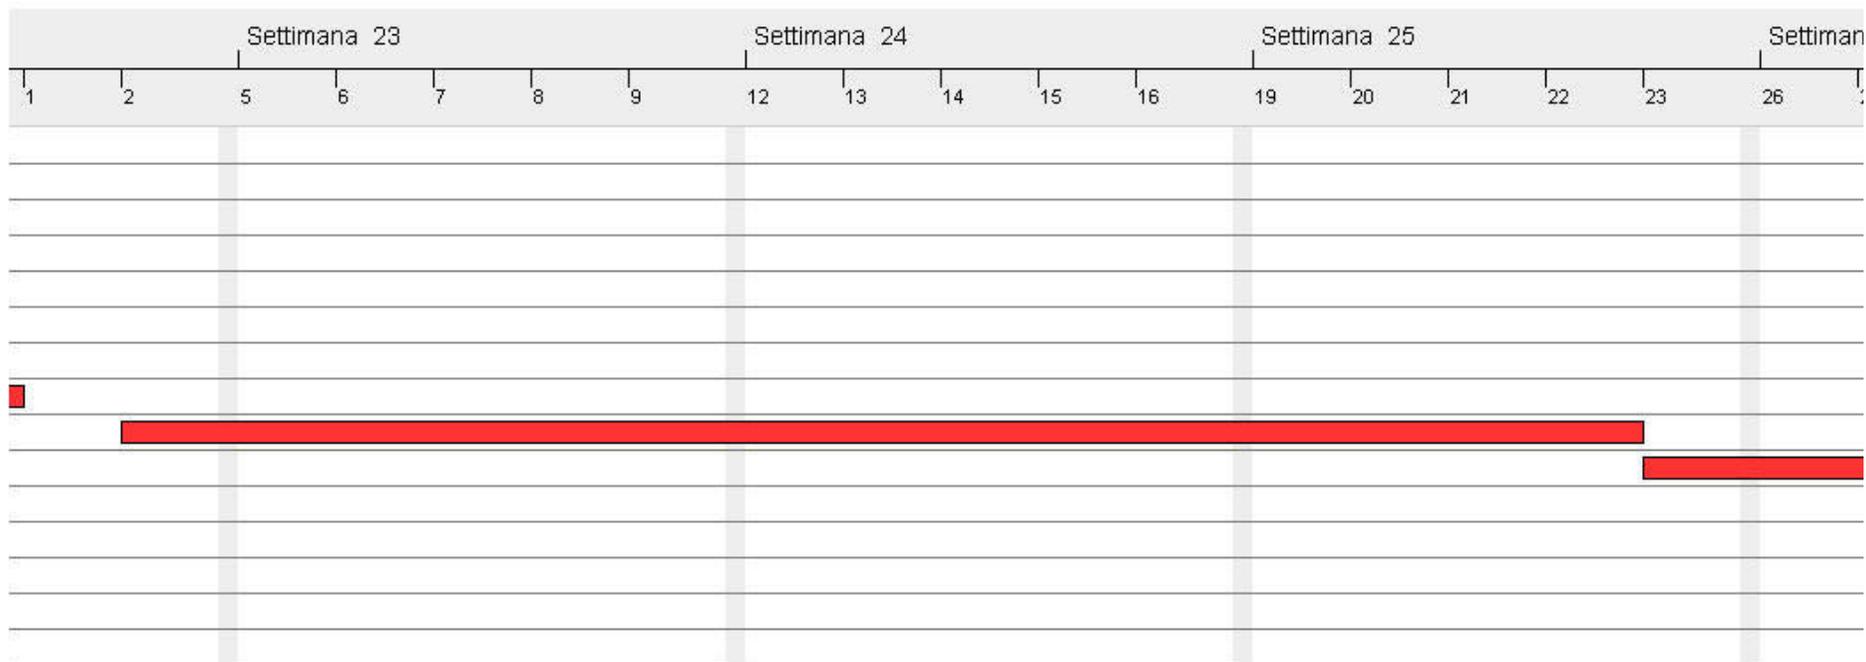

a 26

Settimana 27

Settimana 28

Settimana 29

27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21





