



Regione Siciliana

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana


II Servizio – Distretto Costa Jonica

Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

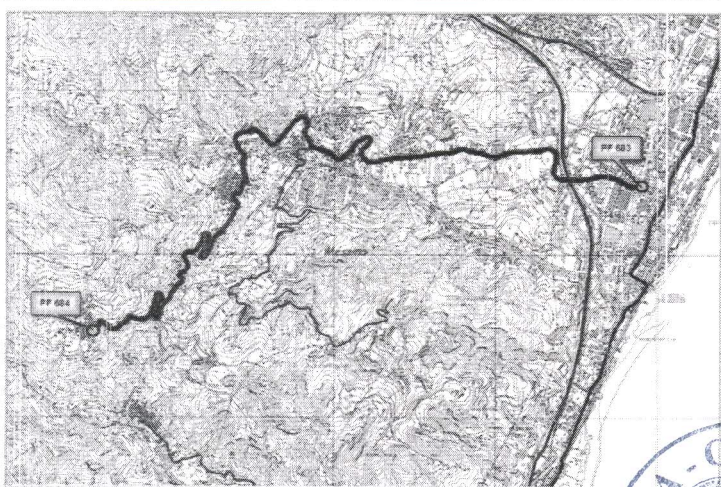

Visti ed approvazioni: Il R.U.P. visti gli elaborati progettuali, APPROVA in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011 e dell'art. 24 della l.r. 08/2016 e s.m.i.

PARERE n° 11 del 21 MAR. 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

Progettisti:

Geom. Carmelo G. MAGGIOLONI

Geom. Pasquale CHIAIA

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giovanni LENTINI

Data

19 MAR. 2019

Il Dirigente F.F.:

Dr. Francesco ROCCA FORTE

Tav. 14

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA – 2° SERVIZIO DISTRETTO COSTA JONICA

OGGETTO: Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli

CIG:

CUP: B47H17001590001

CRONOPROGRAMMA

I lavori di cui all'oggetto dovranno essere condotti ed eseguiti dall'impresa aggiudicataria nell'arco di tempo scaturito dall'elaborazione sotto riportata, che tiene conto di tutti gli elementi (condizioni climatiche stagionali) che possono influire sulla normale esecuzione delle opere determinandone variazioni di produttività.

Pertanto l'impresa aggiudicataria dei lavori non può, per l'esecuzione delle opere previste in progetto, richiedere sospensioni e/o proroghe avendo preventivato nel presente programma lavori tutti i fattori climatici, sia essi positivi che negativi, riscontrabili durante l'arco di tempo previsto per la detta esecuzione.

A tal fine si stabilisce convenzionalmente:

I = Importo complessivo dei lavori:	€.	394.166,27
i = produzione ottimale mensile:	€.	105.000,00
Ig = produzione ottimale giornaliera (i/30):	€.	3.500,00
c = coefficiente per condizioni climatiche normali:		1,54
n = gg. tempo utile contrattuale (I/i * c * 30):		150
n° = tempo di avvio cantiere in giorni:		1
N = tempo teorico contrattuale in giorni (N= n+n°)		151

Produzioni differenziate per l'anno

1	Gennaio	0,75 i	€ 78.750,00	GG. 31
2	Febbraio	0,75 i	€ 78.750,00	GG. 28
3	Marzo	0,75 i	€ 78.750,00	GG. 31
4	Aprile	0,90 i	€ 94.500,00	GG. 30
5	Maggio	0,90 i	€ 94.500,00	GG. 31
6	Giugno	0,90 i	€ 94.500,00	GG. 30
7	Luglio	0,90 i	€ 94.500,00	GG. 31
8	Agosto	0,45 i	€ 47.250,00	GG. 31
9	Settembre	0,90 i	€ 94.500,00	GG. 30
10	Ottobre	0,90 i	€ 94.500,00	GG. 31
11	Novembre	0,90 i	€ 94.500,00	GG. 30
12	Dicembre	0,45 i	€ 47.250,00	GG. 31

Ipotesi di sviluppo

Si ipotizza una consegna lavori in data 02/09/2019:
Consegna lavori in data 02/09/2019
Inizio lavori in data 02/09/2019

DATA	GIORNI TRASCORSI		IMPORTO PARZIALE	IMPORTO PROGRESSIVO
avvio cantiere	1	1	€ 0,00	€ 0,00
Settembre	30	31	€ 94.500,00	€ 94.500,00
Ottobre	31	62	€ 94.500,00	€ 189.000,00
Novembre	30	92	€ 94.500,00	€ 283.500,00
Dicembre	31	123	€ 47.250,00	€ 330.750,00
Gennaio	31	154	€ 78.750,00	€ 409.500,00

La durata dei lavori è quindi risultata pari a 150 giorni, con una differenza in meno di giorni 1 rispetto ai tempi previsti.

Lo sviluppo progressivo delle lavorazioni come sopra riportato, ha validità esclusivamente nel suo complesso, ciò al fine di stabilire il periodo utile per il completamento delle opere progettate.

L'eventuale mancato completamento dell'opera nei tempi assegnati, tranne per cause non preventivabili in fase progettuale, comporterà per l'impresa esecutrice dei lavori l'applicazione di una penale pari allo 0,1% giornaliero dell'importo contrattuale, e comunque non superiore al 10% così come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I PROGETTISTI

Geom. Carmelo G. Maggioloti

Geom. Pasquale CHIAIA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni LENTINI
